



Neerijnen



Projecten



▶ ⏪ 🔊 0:47 / 1:39

📺 ⚙️ 📺 🗉



▶ ⏪ 🔊 0:47 / 1:39



You Tube



Update wegplan voor areaal Neerijnen


projectnummer 0406512.00
concept revisie 00
21 maart 2016



weginspectie in 2014




Structuurelementenkaart 2013

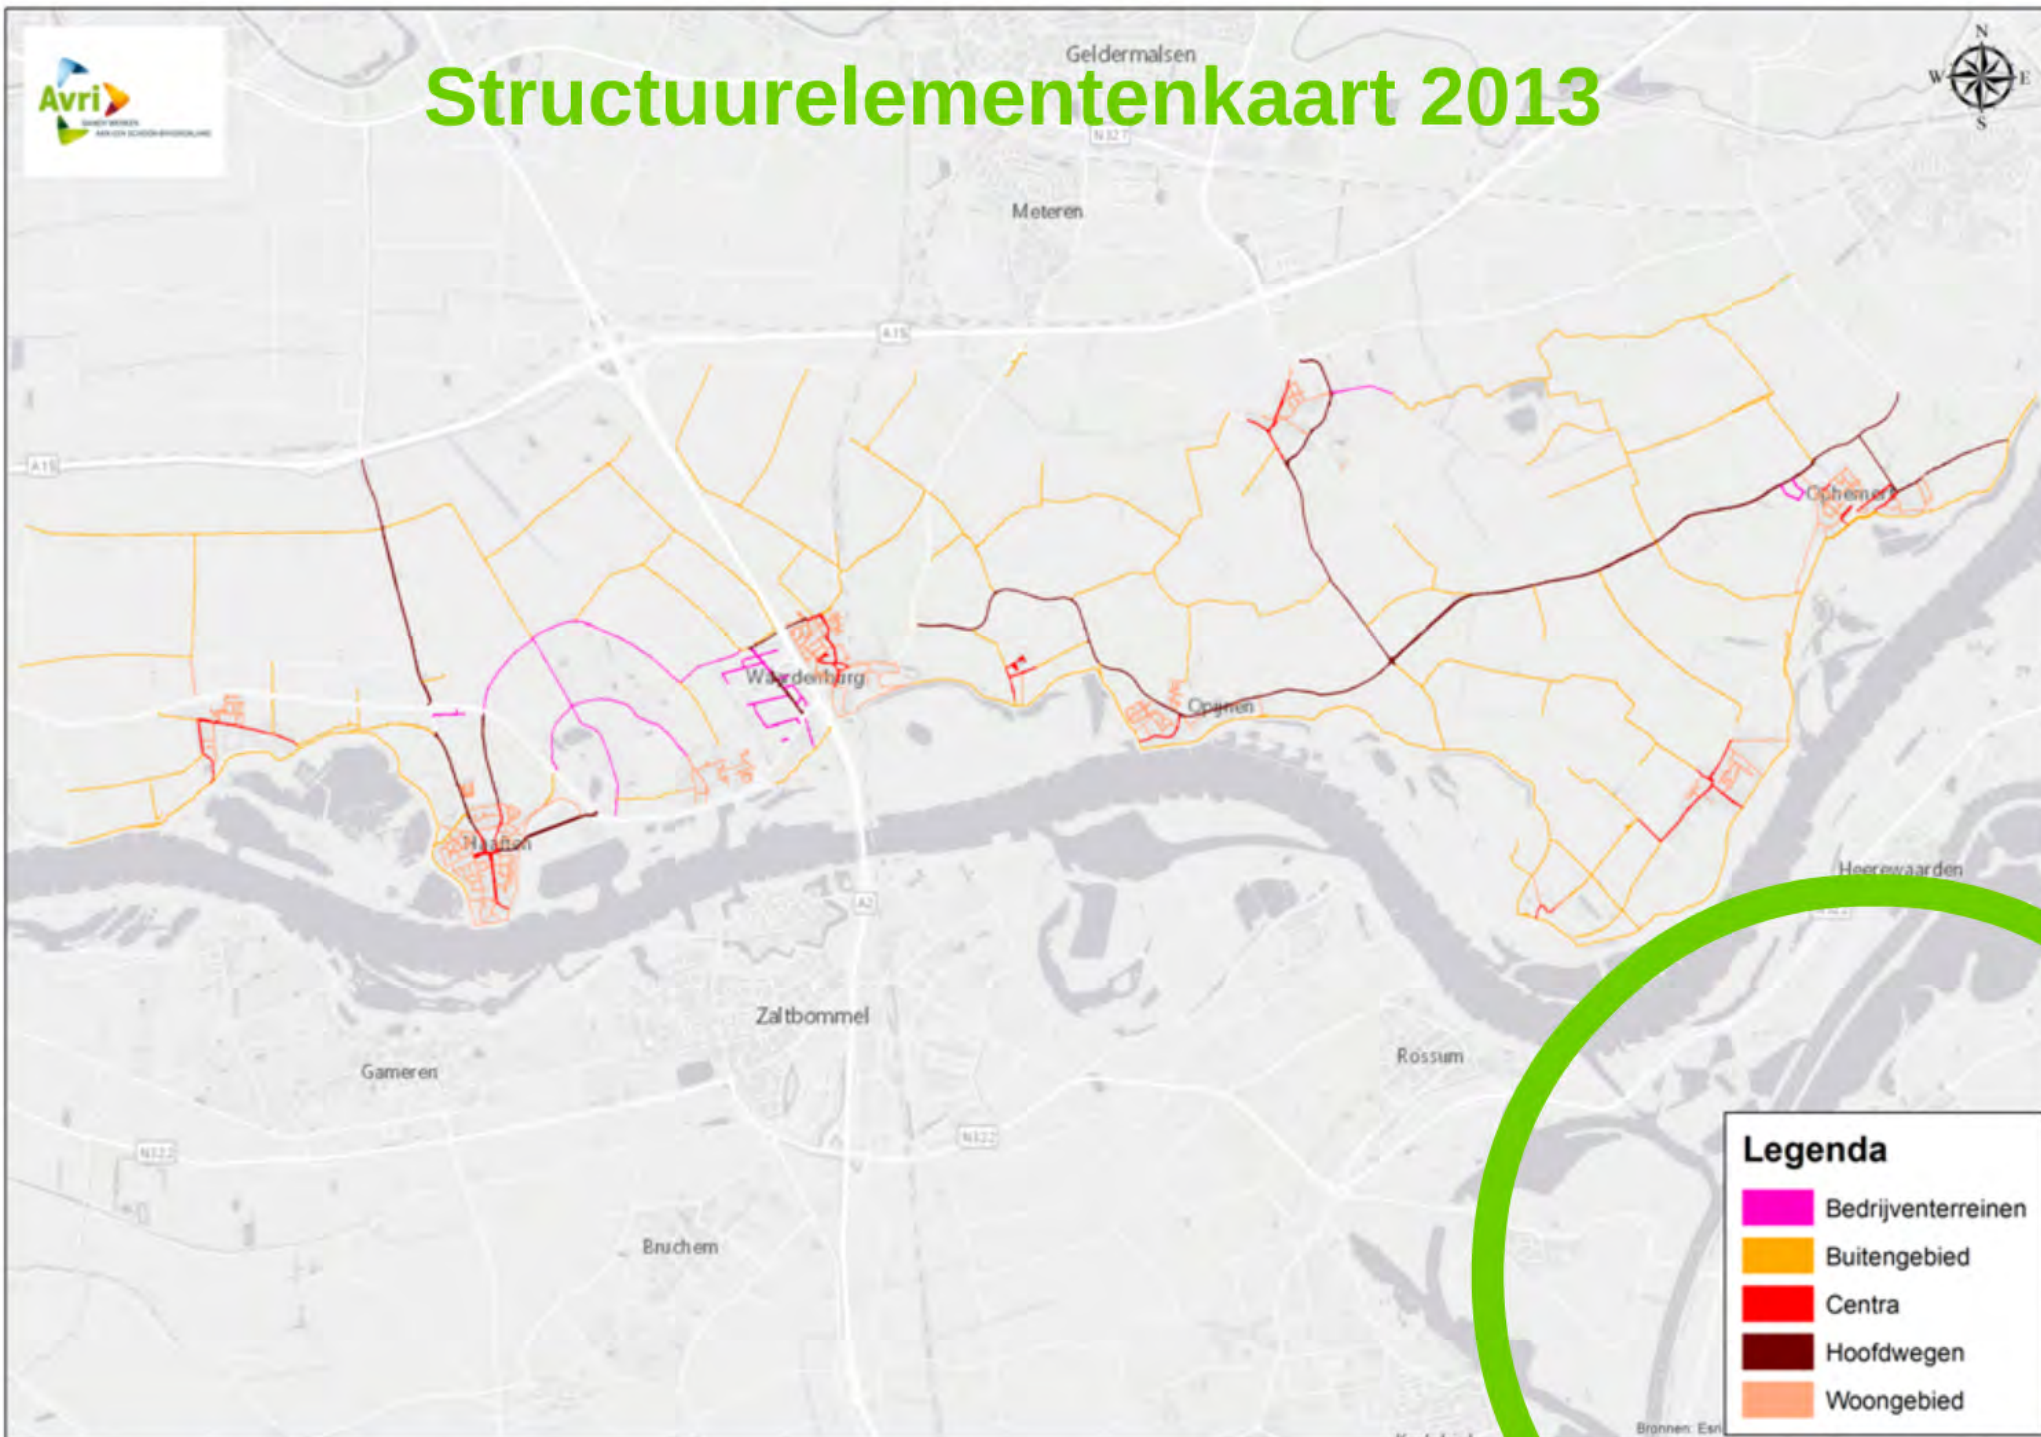

Legenda

-  Bedrijventerreinen
-  Buitengebied
-  Centra
-  Hoofdwegen
-  Woongebied

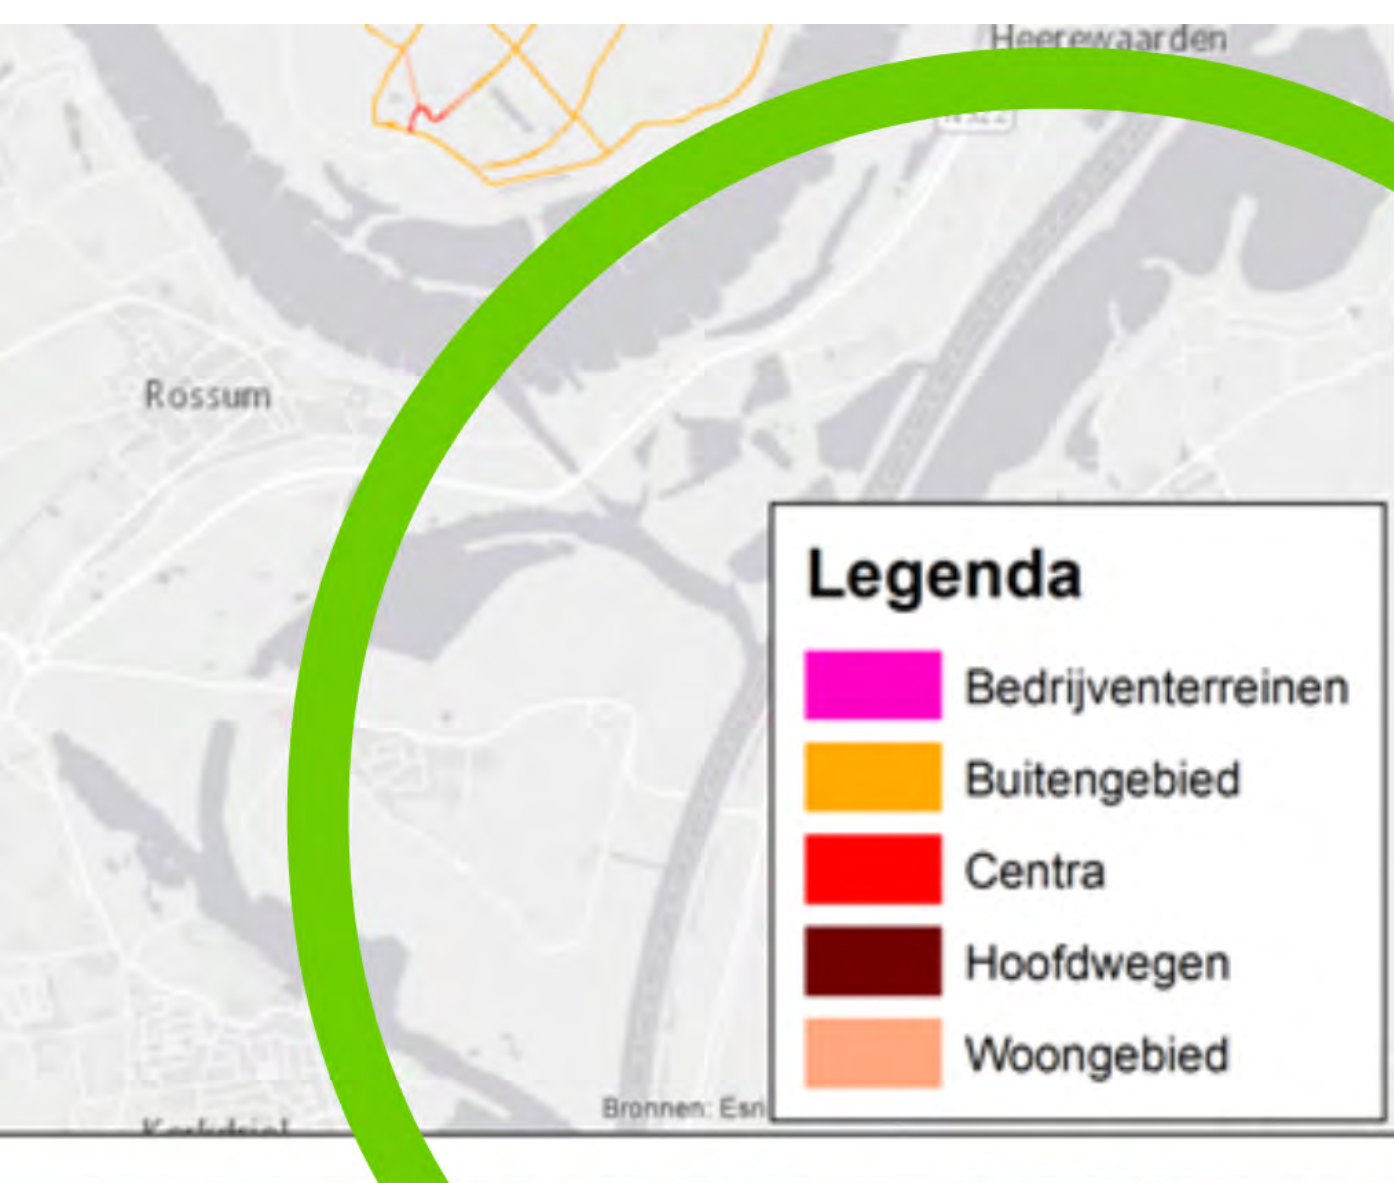


Aanpak

- Keuzes maken
 - Structuurelementenkaart
 - Technisch onderzoek
- Ideaalplaatje (incl. kostenberekening)
 - Verkeersveiligheid
 - Nader onderzoek
 - Bewonerswensen
- College maakt keuzes op basis van budget
- Uitvoering



Projecten 2017

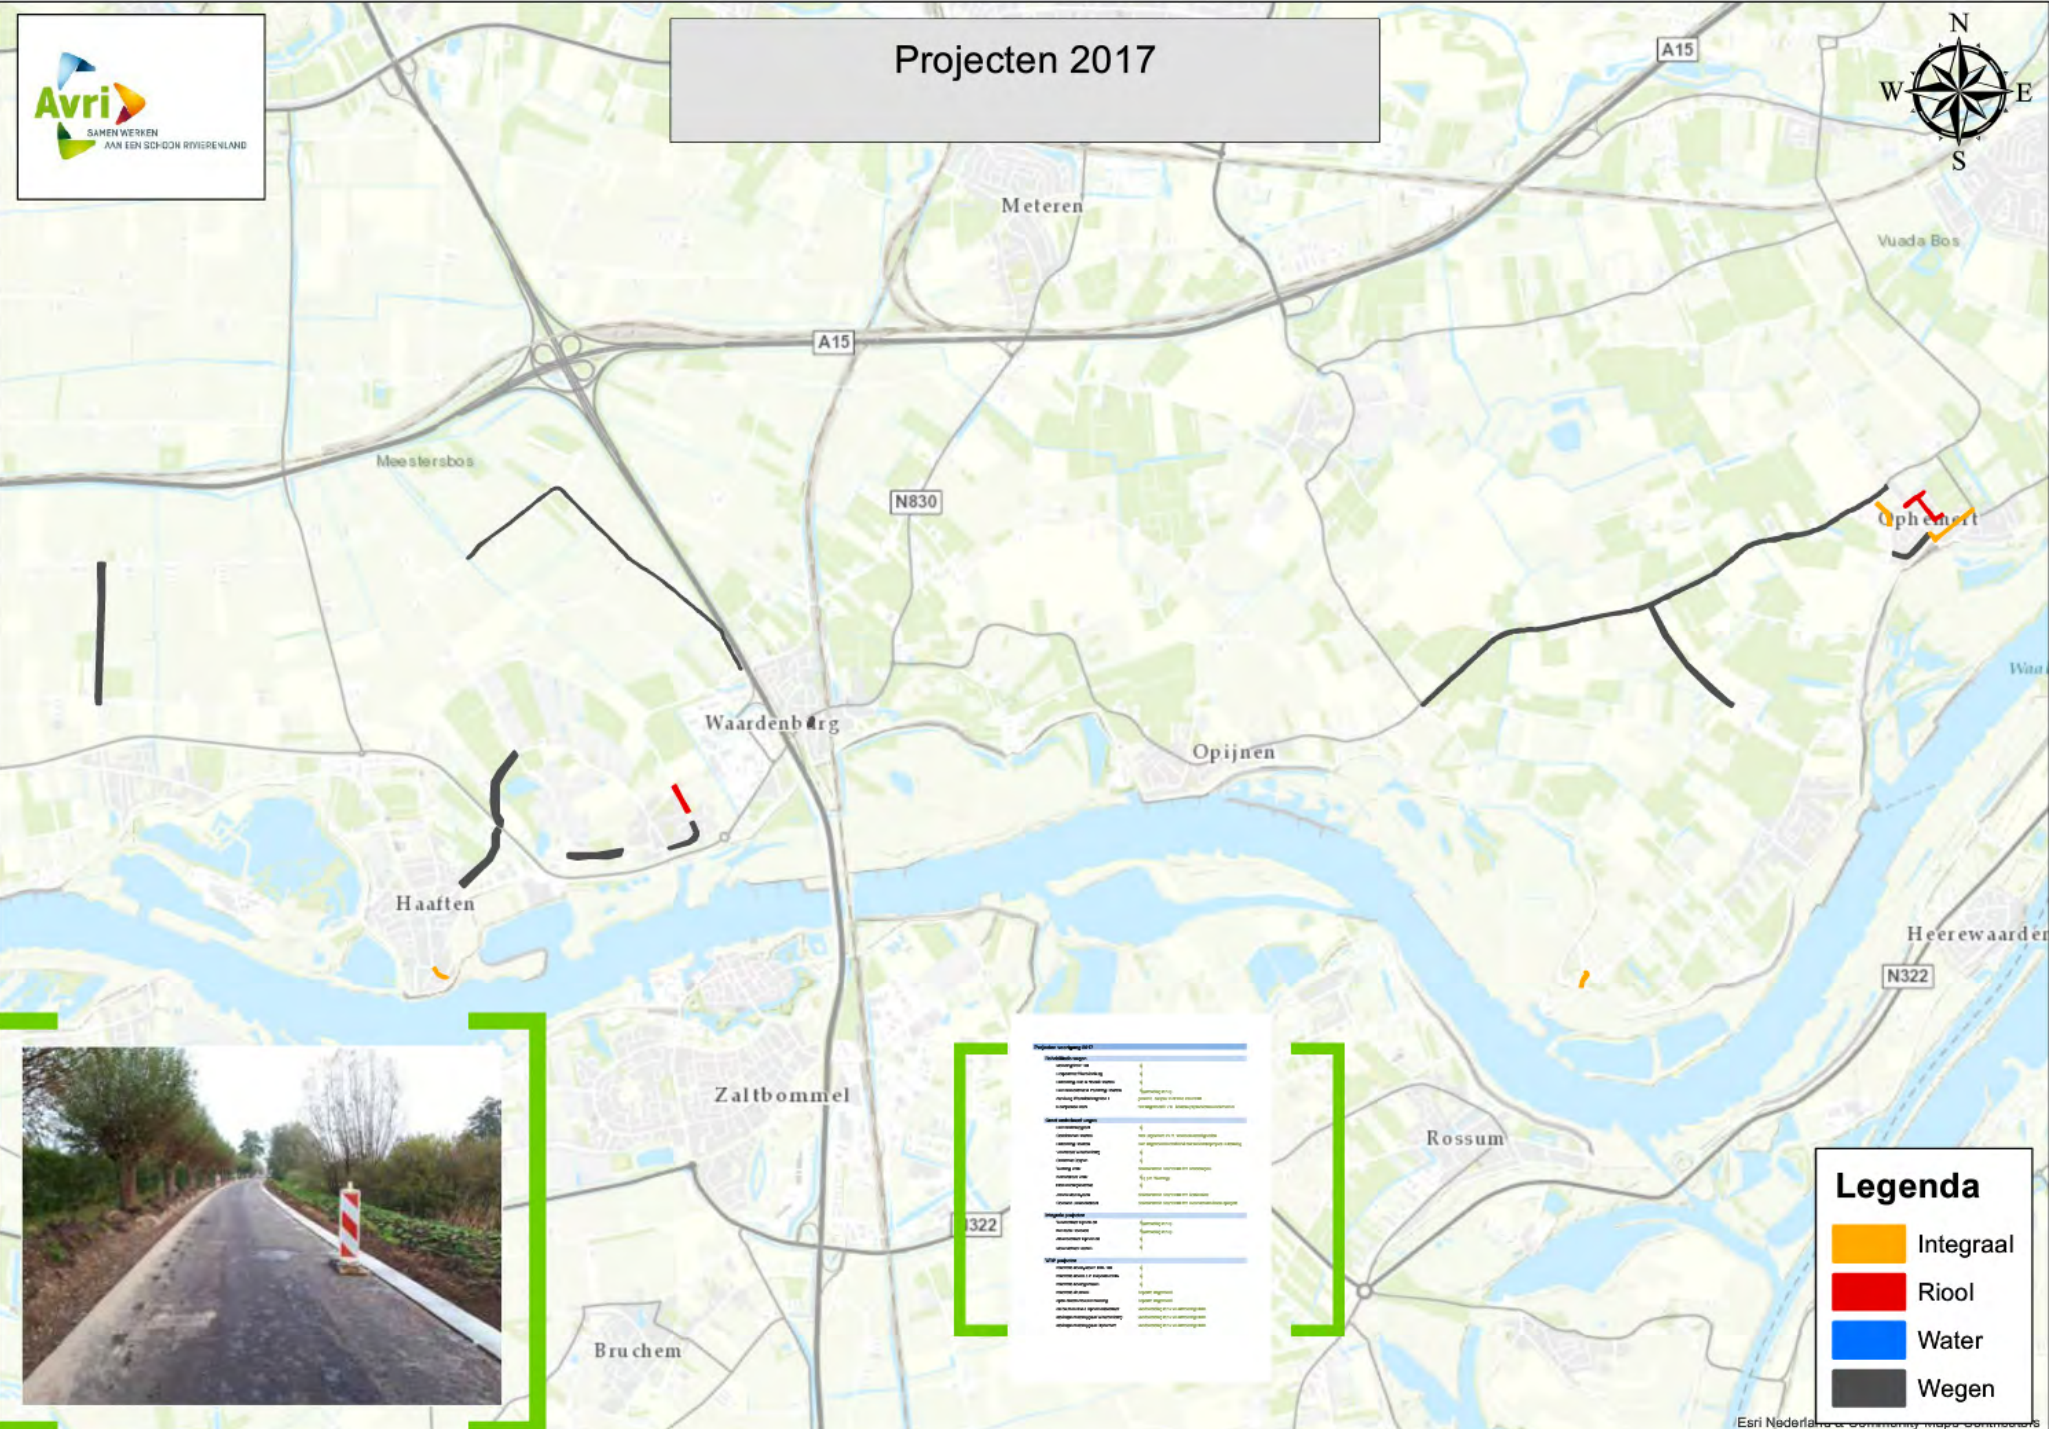

Nieuw ontwerp 2017	
Verkeerswegen	
• Nieuw ontwerp	1
• Uitbreiding	2
• Verbredening	3
• Verhoging van de verkeersveiligheid	4
• Verbetering van de verkeersveiligheid	5
• Verbetering van de verkeersveiligheid	6
• Verbetering van de verkeersveiligheid	7
• Verbetering van de verkeersveiligheid	8
• Verbetering van de verkeersveiligheid	9
• Verbetering van de verkeersveiligheid	10
Wegvoering	
• Nieuw ontwerp	1
• Uitbreiding	2
• Verbredening	3
• Verhoging van de verkeersveiligheid	4
• Verbetering van de verkeersveiligheid	5
• Verbetering van de verkeersveiligheid	6
• Verbetering van de verkeersveiligheid	7
• Verbetering van de verkeersveiligheid	8
• Verbetering van de verkeersveiligheid	9
• Verbetering van de verkeersveiligheid	10
Wegvoering	
• Nieuw ontwerp	1
• Uitbreiding	2
• Verbredening	3
• Verhoging van de verkeersveiligheid	4
• Verbetering van de verkeersveiligheid	5
• Verbetering van de verkeersveiligheid	6
• Verbetering van de verkeersveiligheid	7
• Verbetering van de verkeersveiligheid	8
• Verbetering van de verkeersveiligheid	9
• Verbetering van de verkeersveiligheid	10

Legenda

- Integraal
- Riool
- Water
- Wegen

Projecten voortgang 2017

Rehabilitatie wegen

Melssingdreef Tuil	√
Dorpsstraat Waradenburg	√
Buitenweg Zuid & Noord Haaften	√
Bommelsestraat & Paasweg Haaften	√ (afronding 2018)
Zandweg Waardenburg fase 1	gecomb. aanpak met fase 2 in 2018
Neerijnense Mark	niet uitgevoerd i.v.m. bestem.pl.procedure ondernemer

Groot onderhoud wegen

Bommelkampgraaf	√
Gendershof Haaften	Niet uitgevoerd i.v.m. weersomstandigheden
Buitenweg Haaften	niet uitgevoerd in verband met renovatieproject Buitenweg
Veerstraat Waardenburg	√
Slotstraat Opijnen	√
Weiweg Varik	doorschuiven naar 2018 ivm omléidingen
Keizerstraat Varik	√ (i.p.v. Weiweg)
Blankenburgsestraat	√
Aneas Mackaylaan	doorschuiven naar 2018 ivm bouwkaavel
Goossen Janssenstraat	doorschuiven naar 2018 ivm reconstructie boomspiegels

Integrale projecten

Weverstraat Ophemert	√ (afronding 2018)
Kerklaan Heesselt	√ (afronding 2018)
Akkersestraat Ophemert	√
Molenstraat Haaften	√


WRP projecten

renovatie riolsysteem BBL Tuil	√
renovatie riool n.a.v. inspectie 2015	√
renovatie hoofdgemalen	√
renovatie drukriool	beperkt uitgevoerd
optimalisatie vacuümriolering	beperkt uitgevoerd
ombouwen IBA's Ophemertsestraat	voorbereiding 2017 en uitvoering 2018
stedelijke wateropgave Waardenburg	voorbereiding 2017 en uitvoering 2018
stedelijke wateropgave Ophemert	voorbereiding 2017 en uitvoering 2018





Projecten 2018

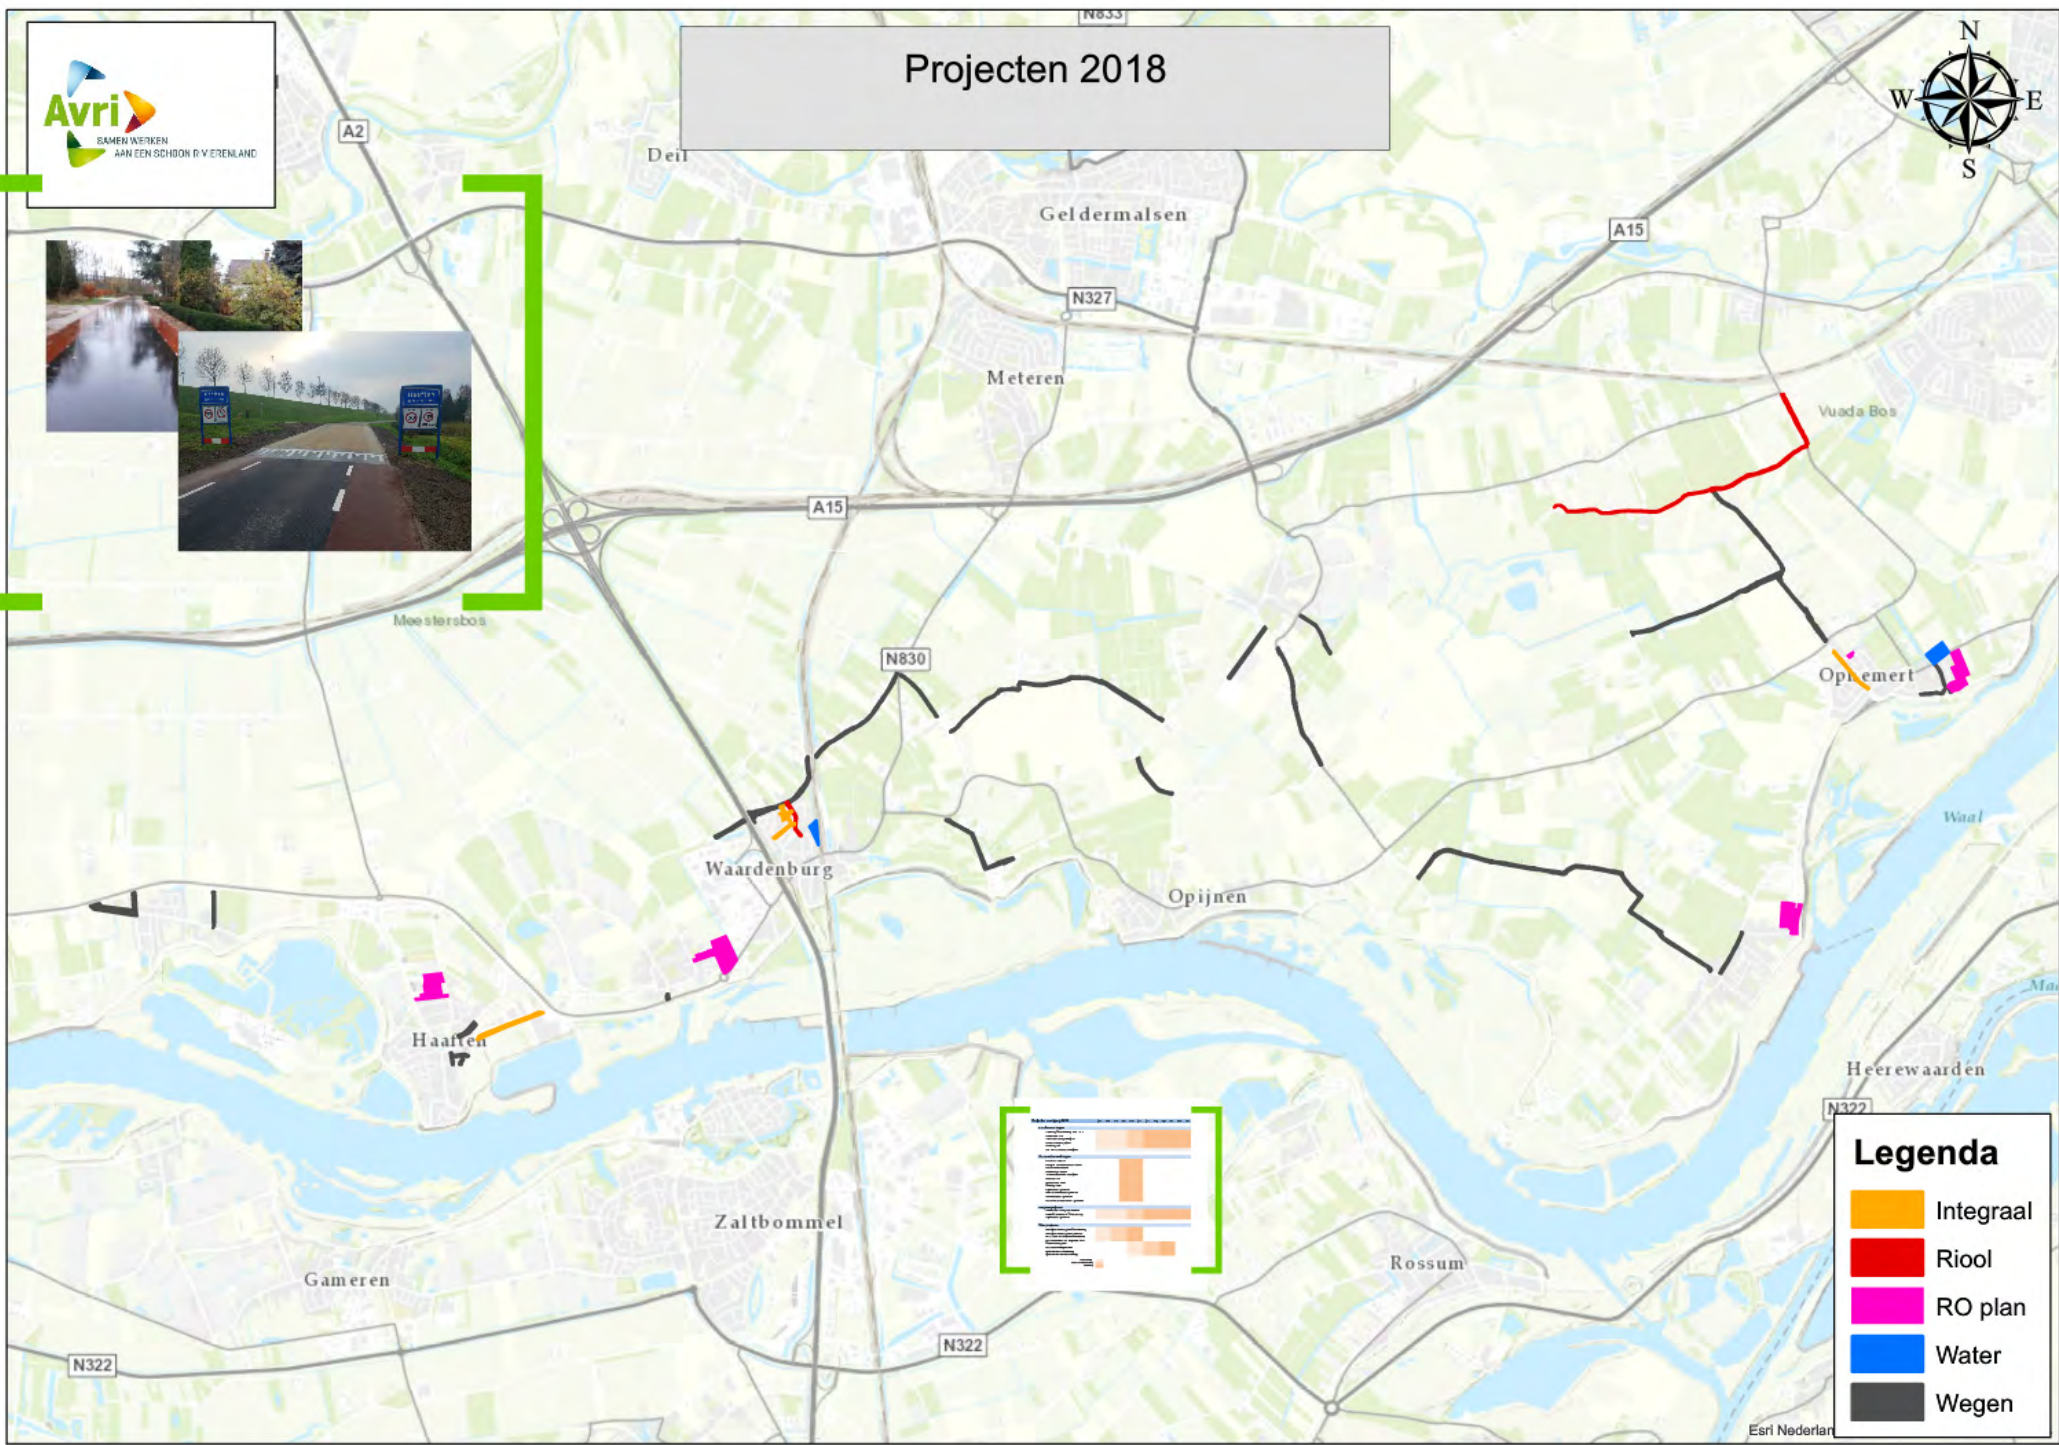

Legenda

- Integraal
- Riool
- RO plan
- Water
- Wegen

Legend

- Integraal
- Riool
- RO plan
- Water
- Wegen

Projecten voortgang 2018

jan febr mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rehabilitatie wegen

- Zandweg Waardenburg fase 1 & 2
- Kortestraat Tuil
- Van Pallandweg Neerijnen
- Estse Omloop Opijnen
- Esterweg Est
- A.H. de Kockstraat Neerijnen

Groot onderhoud wegen

- Oudenhof Hellouw
- Fietspad Bernhardstraat Haaften
- Gendershof Haaften
- Buitenweg Haaften
- 1e Tieflaarsestraat Neerijnen
- De Kraan Est
- Achterstraat Varik
- Weiweg Varik
- Kapelstraat Ophemert
- Bulkheuvelsestraat Ophemert
- Akkersestraat Ophemert
- Goossen Janssenstraat Ophemert

Integrale projecten

- Irenestraat / Korfgraaf Hellouw
- Korte Woerden e.o. Waardenburg
- Kapelstraat Ophemert


WRP projecten


- stedelijke wateropgave Waardenburg
- stedelijke wateropgave Ophemert
- ombouwen IBA's Ophemertsestraat
- renovatie riool n.a.v. inspectie 2015
- Watermaatregelen
- renovatie hoofdgemalen
- optimalisatie drukriolering
- optimalisatie vacuümriolering

voorbereiding
 bestek en aanbesteding
 uitvoering





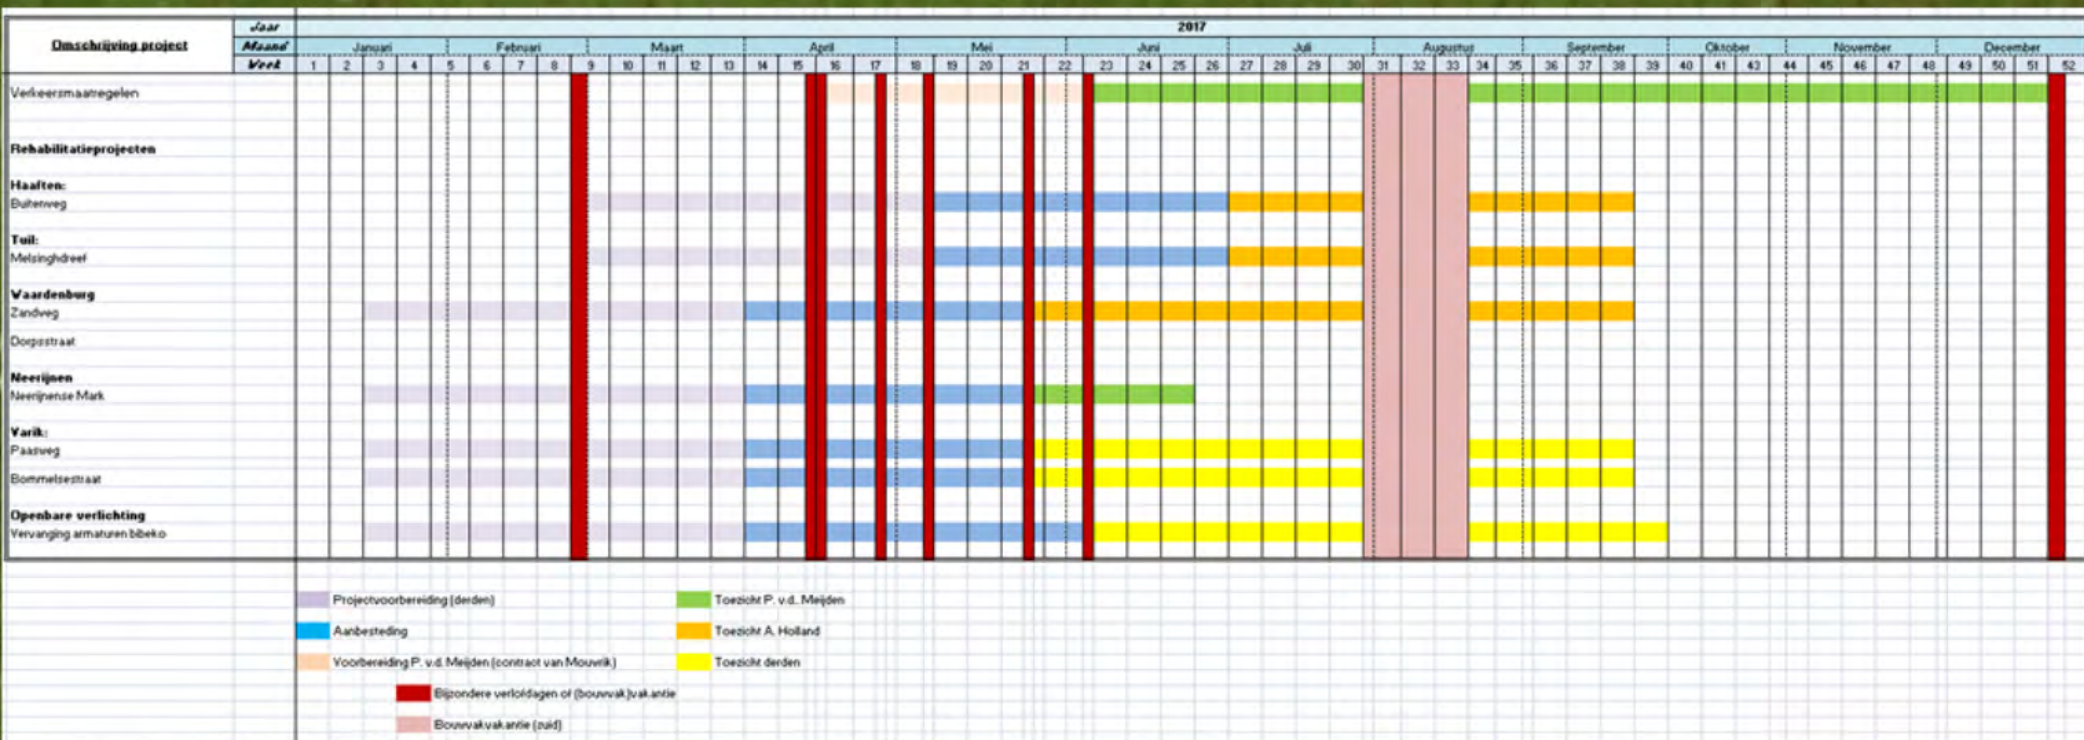

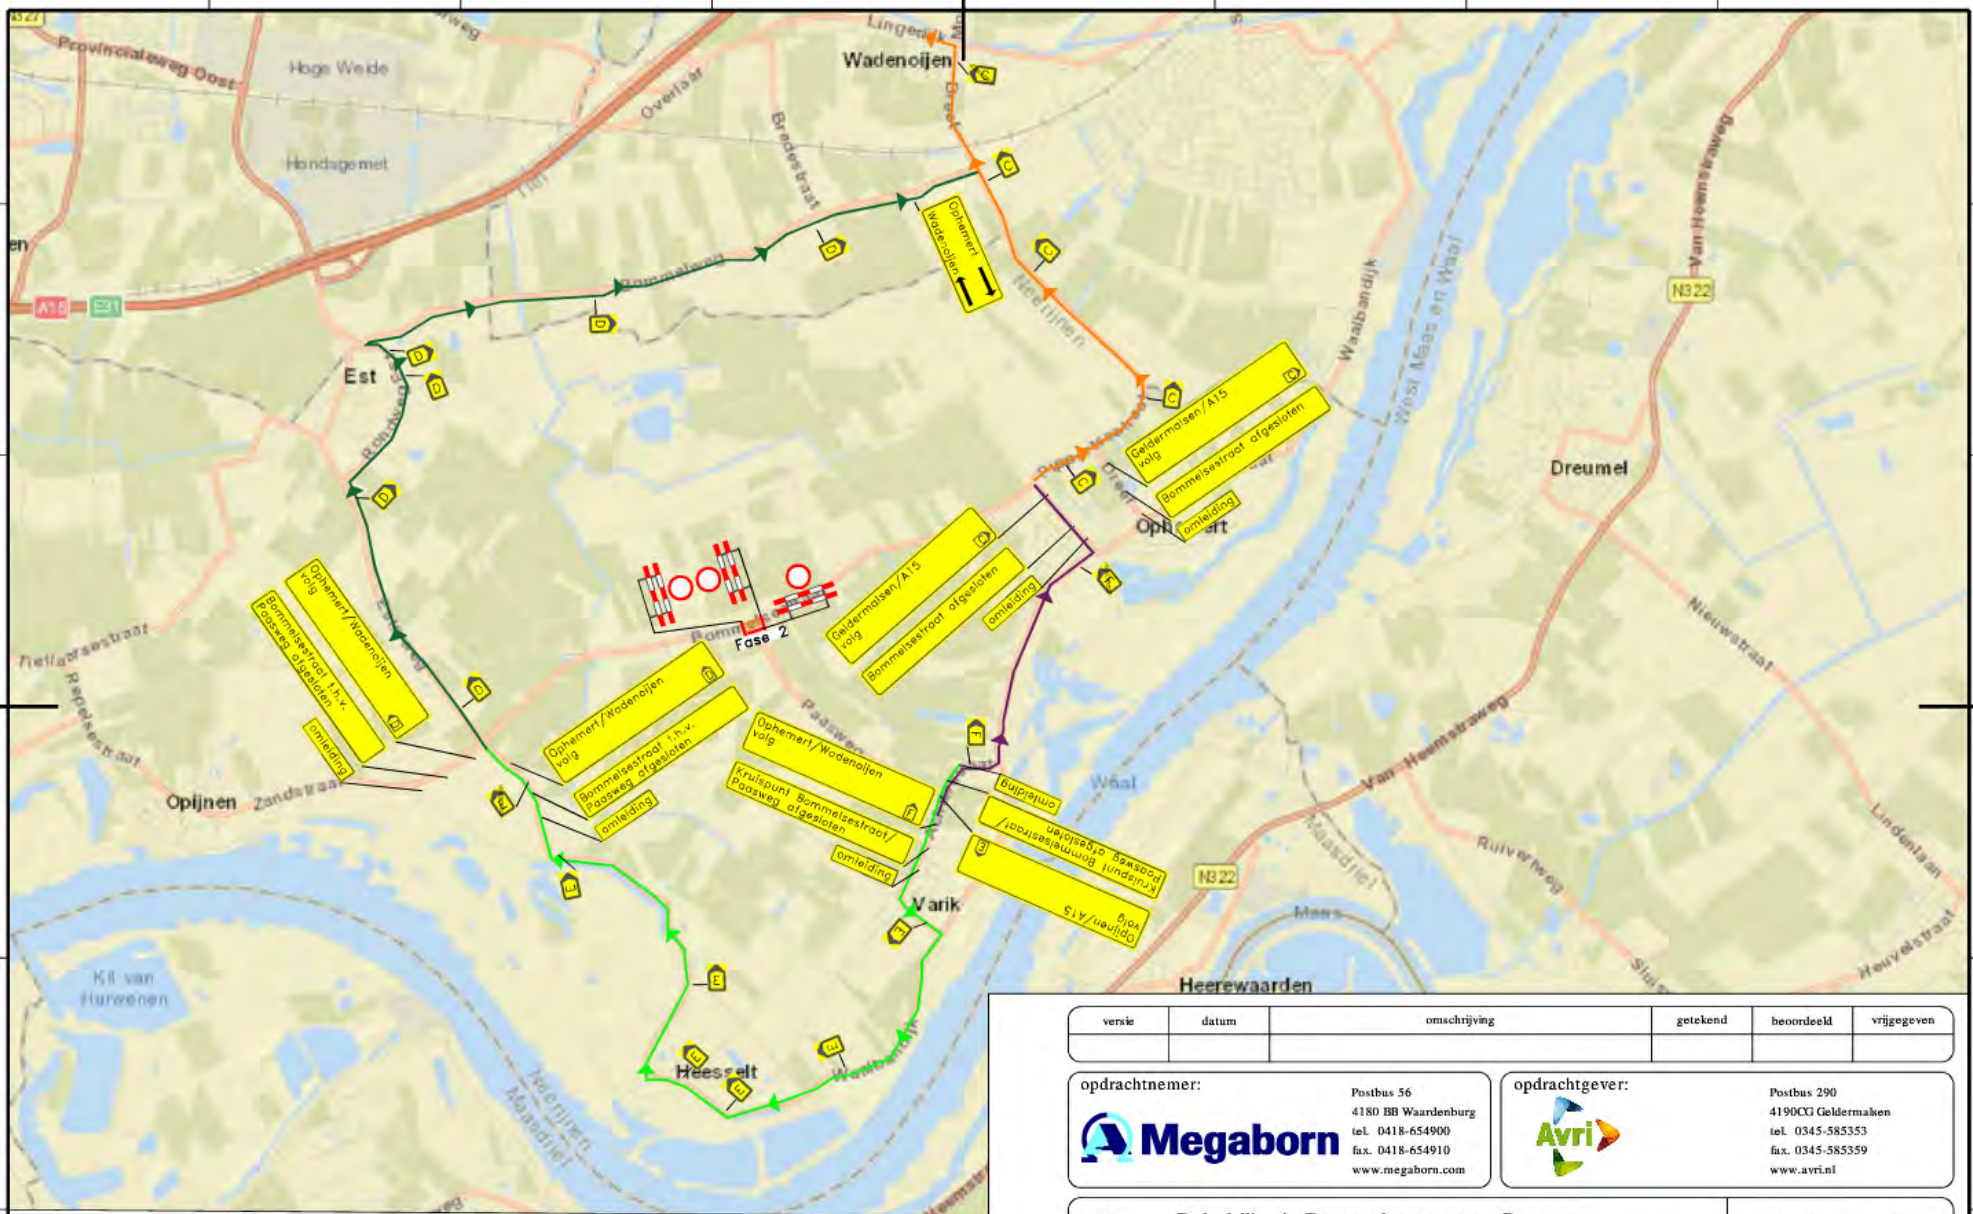

Legenda

- Werkvak
- Omleiding C
- Omleiding D
- Omleiding E
- Omleiding F

versie	datum	omschrijving	getekend	beoordeeld	vrijgegeven

opdrachtnemer:

Megaborn

Postbus 56
4180 BB Waardenburg
tel. 0418-654900
fax. 0418-654910
www.megaborn.com

opdrachtgever:

Avri

Postbus 290
4190CG Geldermalsen
tel. 0345-585353
fax. 0345-585359
www.avri.nl

werk: Rehabilitatie Bommelsestraat en Paasweg		tekening: 21 van 23
onderdeel: Verkeersmaatregelen en omleidingen Fase 2		formaat: A3 schaal: nvt
projectfase: Bestek		status: concept
getekend: CTa	beoordeeld: EMi	vrijgegeven:
datum: 29-06-2017	datum: 29-06-2017	datum:
archiefnummer: DAr1706	besteknummer: DAr1706	tekeningnummer: DAr1706-403b

Communicatie

- Informeren en laten participeren van belanghebbenden
- inzet afhankelijk van projecttype en impact

Middelen: klankbordgroep, inspraakavond, ontwerp sessies, keukentafelgesprekken, projectnieuwsbrief, website



Avri Projectnieuws 20 december 2017

> Werkzaamheden aan de Bommelsestraat

Contactpersoon: de heer R. Bakermans, bakermans@avri.nl (06 - 47 66 29 45)

Verbetering van de bermen aan de Bommelsestraat

Avri heeft de afgelopen 4 weken werkzaamheden verricht aan de bermverhardingen van de Bommelsestraat.

Wat hebben we al gedaan?

In de afgelopen 4 weken hebben we langs de Bommelsestraat over het traject 'Kapelstraat - rondede nabij Opijnen' de bermverhardingen aangebracht. Het asfalt is op vele plaatsen voorzien van nieuw asfalt en we zijn nu bezig om de bermen weer netjes vlak aan te sluiten op het wegdek.

Duur werkzaamheden/ Openstelling

Wij hebben u eerder laten weten dat de werkzaamheden tot en met 22 december zouden duren. Op een deel van de rijbaan loopt de planning enkele dagen uit omdat er erg veel reparaties aan het asfalt nodig zijn.

Wij stellen de rijbaan tussen Opijmeret en de Paasweg open op 22 december a.s. Dat geldt ook voor het knoispunt Paasweg-Bommelsestraat.

De rijbaan tussen Paasweg en rtonde nabij Opijnen blijft tijdens de kerstdagen afgesloten. Direct na de kerst gaan we de bermen op dit traject afwerken, dit zal enkele dagen werk zijn. Waarschijnlijk is de gehele Bommelsestraat op 28 of 29 december weer open voor verkeer.

Wat kunt u nog verwachten

We moeten nog enkele reparaties uitvoeren. Daarvoor hoeven we de weg niet helemaal af te sluiten, maar nodig stellen we tijdelijke verkeersmaatregelen in. Wij gaan er van uit dat de Bommelsestraat niet meer wordt afgesloten.

In het voorjaar zullen we nog een slijflaag aanbrengen op de Paasweg. Voor deze werkzaamheden zal wel een afzetting nodig zijn. Deze werkzaamheden zullen relatief kort zijn (2 à 3 dagen).

Wie voert de werkzaamheden uit?

Aannemer Van Kessel Wegenbouw uit Buren is de aannemer die voor dit werk is gekozen. Avri houdt toezicht op de werkzaamheden.

Zachte bermen

De bermen zijn nu volledig verzadigd met water. Daarom kunnen wij de grond niet verstuiven door trillen of walsen en blijft de grond voorlopig zacht. Houdt u er rekening mee dat u momenteel niet met uw auto door de bermen kunt rijden. Deze hebben meer tijd nodig om hard te worden. Wij zullen ook waarschuwingsborden plaatsen met de tekst 'zachte berm'.

Tot slot

Wij realiseren ons heel goed dat de omgeving de laatste tijd erg veel overlast heeft gehad omdat er op dit moment zoveel projecten tegelijk bezig zijn in de omgeving Ophemert en Vark. Wij proberen altijd om overlast te voorkomen en spannen ons in om u goed te informeren. Wij bieden onze excuses aan voor deze overlast en bedanken u voor uw begrip en geduld.

Namens Avri en de aannemer wensen wij u alvast fijne feestdagen!

Heeft u vragen?

Wanneer u naar aanleiding deze informatie nog vragen hebt kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers of de aannemer:

- Contactpersoon vanuit Avri voor de realisatie van dit project is de heer R. Bakermans, bakermans@avri.nl (06 - 47 66 29 45) (tijdens kantooruren)
- Contactpersoon vanuit aannemer voor de realisatie van dit project is de heer M.B.W. Kraaijeveld, projecten@kessel.nl (06 - 22 81 47 19)

U kunt het Avri Projectnieuws altijd terugvinden op onze website: www.avri.nl/projectnieuws.



Veilig op weg...

